

*Plano de Gestão 2025/2026*

# **1ª RAE/2025**


Reunião de Avaliação da Estratégia

**Realização:**


Núcleo de Planejamento, Transparência, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental-NPTS

**PAINEL DE GESTÃO DE PROJETOS - Plano de Gestão 2025/2026**  
**1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2025**

Total de Projetos por Status

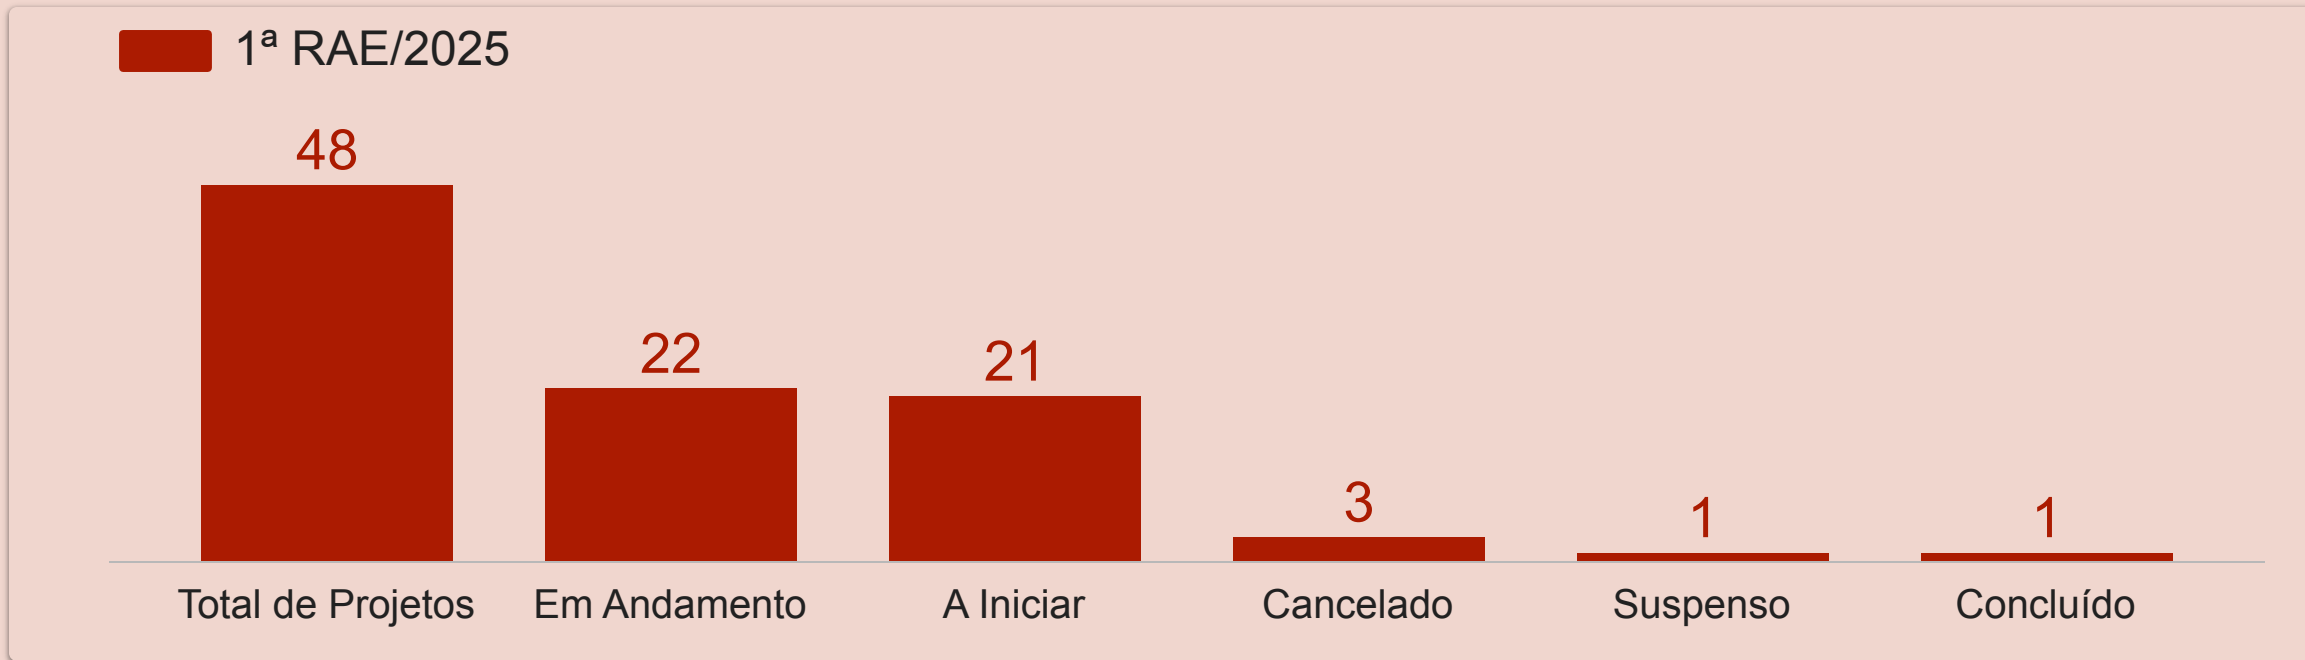

Percentual por Status dos Projetos

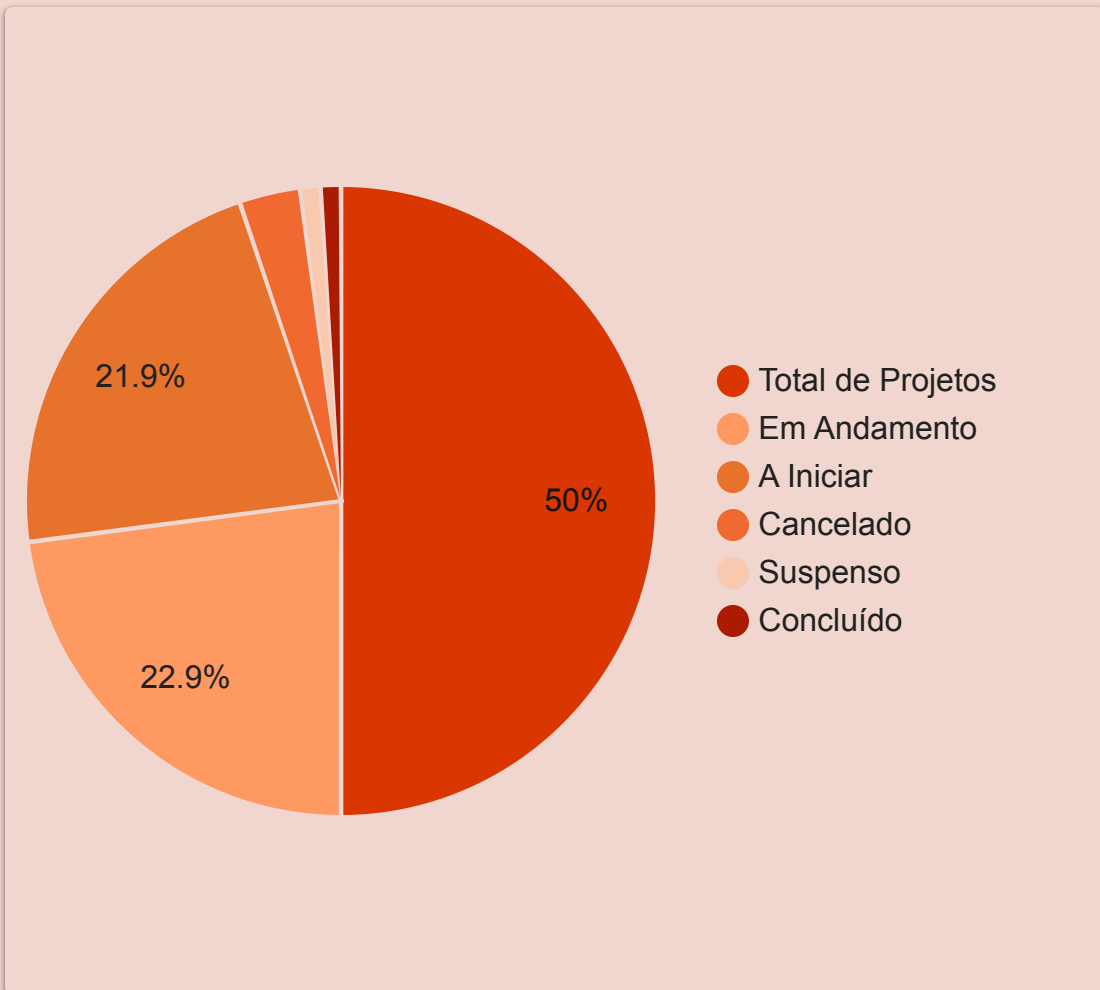

A implementação da Gestão por Resultados define a meta de cumprimento de pelo menos 70% de projetos concluídos na Gestão 2025/2026. O Total de Projetos abaixo, é Total de Projetos Prioritários no Plano de Gestão (48), menos os Cancelados (3).

Total de Projetos	Meta	Projetos Concluídos	% Alcance da Meta	% Alcance Total
45	31	1	2,22	2,08

# SETOR

- 01. NPTS
- 02. Ouvidoria
- 03. Cons. Substitutos
- 04. DGP
- 05. DAD
- 06. DIPLAMFCE
- 07. CCE
- 08. CCI
- 09. NIE
- 10. NAP
- 11. ASCOM
- 12. SEGER
- 13. Corregedoria
- 14. DIORF
- 16. Presidência
- 17. DIJUR



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

## NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

### Gerente de Projetos ▲

01. Fábio Vieira

Total de Projetos

**48**

Em Andamento

**24**

Concluído

**1**

A Iniciar

**19**

Atrasado

**0**

Cancelado

**3**

Suspenso

**1**

### Justificativa ▼

Projeto incorporado ao Contratação de Consultoria.

### % A Executar ▼

80,59

### % EXECUTADO ▼

995,35

Projeto ▼	Início	Término	Status do Projeto
Revisão dos normativos internos referente aos contratos temporários para adequação às alterações da Lei Complementar n. 156/2022	01/06/2025	31/08/2025	A Iniciar
Revisão da Resolução 18/2018 para adequação ao Regimento Interno	01/06/2025	15/12/2025	A Iniciar
Requalificação e modernização do Edifício Anexo do TCM-PA (Tv. Magno de Araújo)	09/02/2026	10/12/2026	A Iniciar
Reestruturação dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos	20/01/2025	12/01/2026	Em Andamento
Reestruturação do andar Térreo do prédio sede deste TCM	10/03/2025	12/01/2026	Em Andamento



1 - 48 / 48 < >

### Totais por Execução das Tarefas

Total de dias para executar ▼	Total de Dias Executado	Dias a Vencer	% Desempenho
625	458	Finaliza em : 235 dias	62,40

Tarefas ▼	Início	Término	Status	Código
realocação temporária da ouvidoria para execução da 1ª etapa da obra	18/08/2025	25/08/2025	A Iniciar	136
realocação dos setores/funcionalidades nas áreas reformadas	10/10/2025	20/10/2025	A Iniciar	127
Validação das políticas de metas	07/07/2025	11/07/2025	A Iniciar	57
Validação da Proposta do Novo Planejamento Estratégico	31/10/2025	05/11/2025	A Iniciar	323
Treinamento/Capacitação dos gestores para implementação	15/11/2025	20/11/2025	A Iniciar	325
Treinamento dos Usuários e Integração com o Fluxo de Trabalho; Capacitação dos servidores; Ajustes finais na interface do usuário; Implementação da IA no ambiente de produção.	01/02/2026	31/03/2026	A Iniciar	232
Treinamento dos Terceirizados da limpeza	13/08/2025	31/08/2025	Cancelado	5

1 - 100 / 341 < >

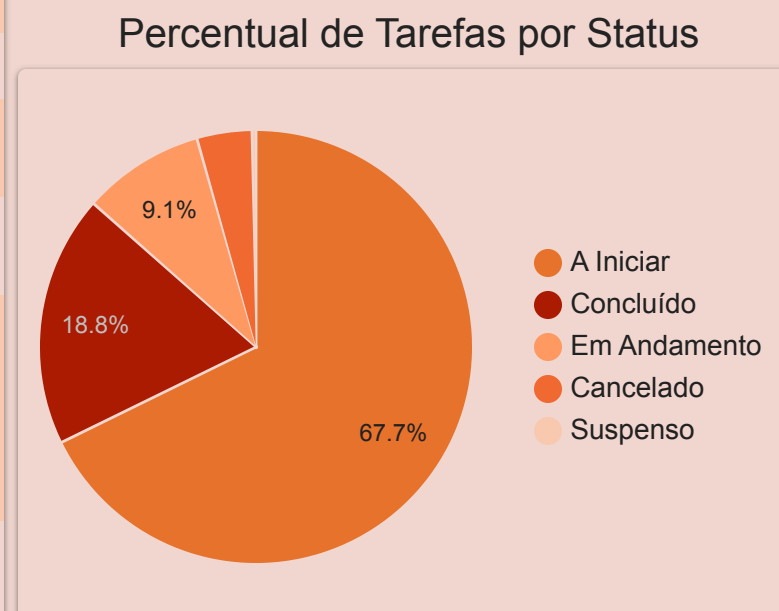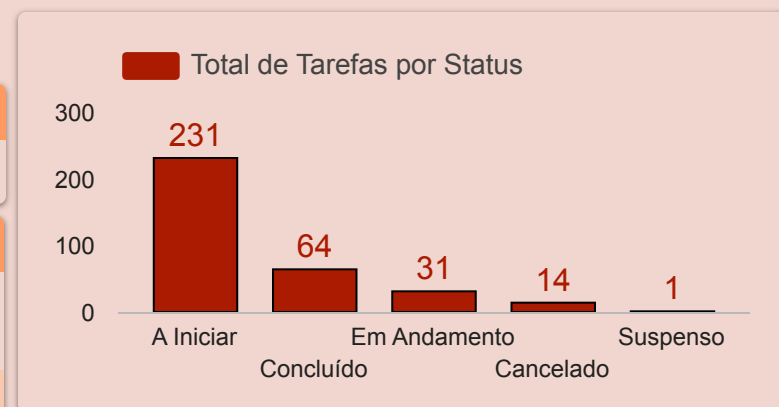


A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) atuará como Setor Aderente em todos os projetos que contemplarem o desenvolvimento de sistemas, a fim de assegurar a conformidade com as diretrizes tecnológicas institucionais e garantir a qualidade das soluções implementadas.


SETORES

Outros Setores

DTI Aderente

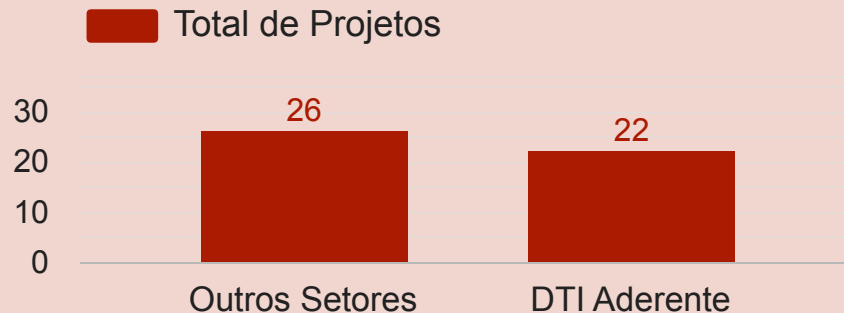




Percentual por Total de Projetos

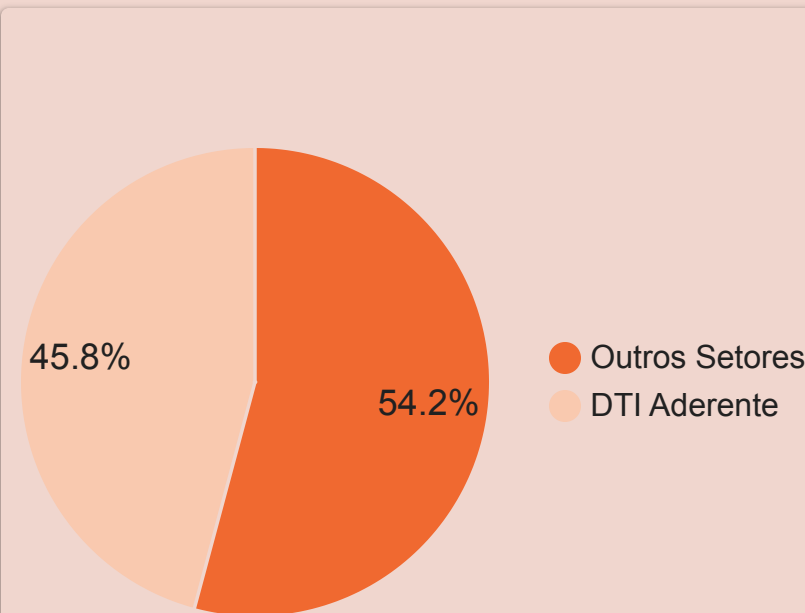

Projeto	Status	Setor
Revisão dos normativos internos referente aos contratos temporários para adequação às alterações da Lei Complementar n. 156/2022	A Iniciar	3. Cons. Substitutos
Revisão da Resolução 18/2018 para adequação ao Regimento Interno	A Iniciar	3. Cons. Substitutos
Requalificação e modernização do Edifício Anexo do TCM-PA (Tv. Magno de Araújo)	A Iniciar	5. DAD

1 - 48 / 48 < >

Percentual de Tarefas por Status

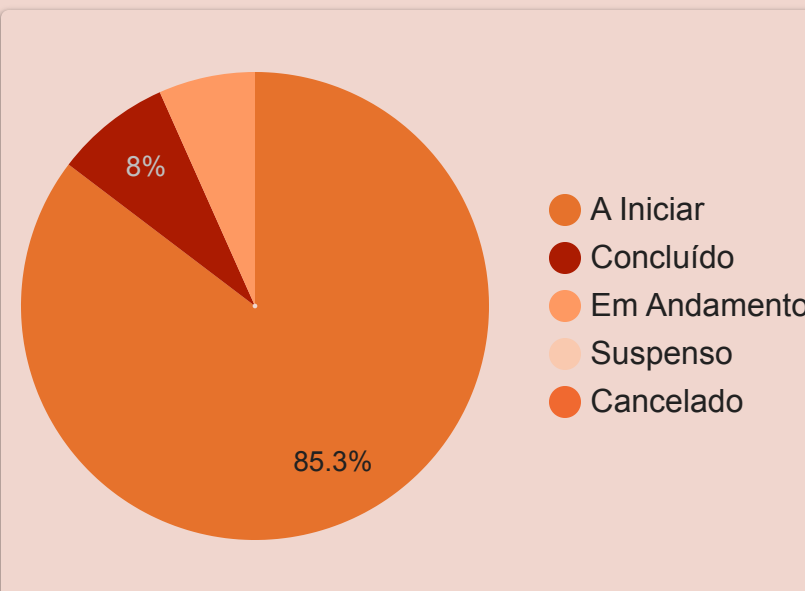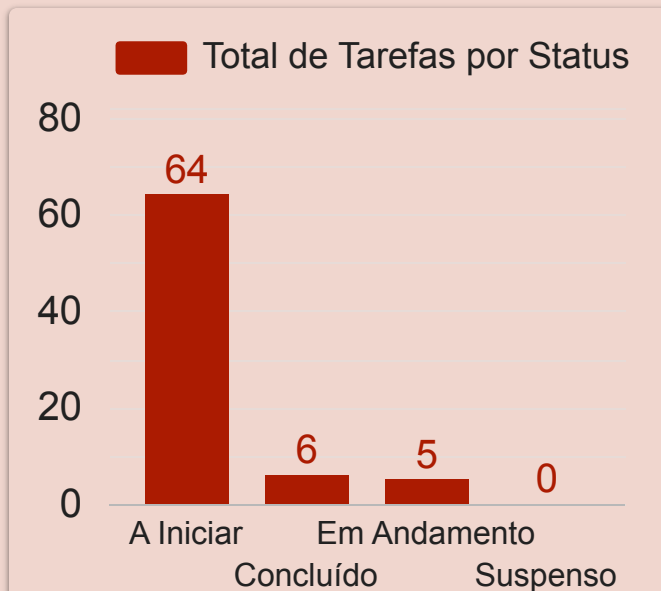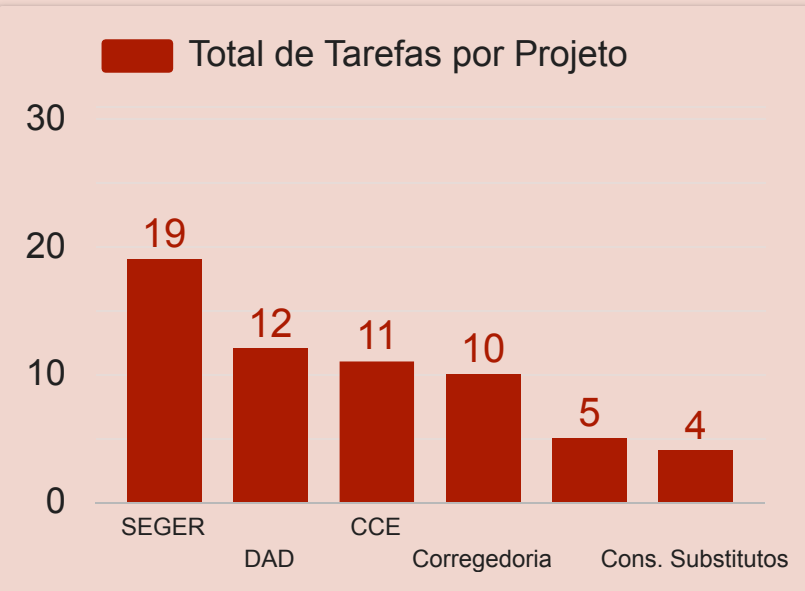

Tarefas	Início	Término	Status	Dias a Vencer
realocação temporária da ouvidoria para execução da 1ª etapa da obra	18/08/2025	12/01/2026	A Iniciar	Concluída Há: 227 dias
realocação dos setores/funcionalidades nas áreas reformadas	10/10/2025	31/10/2025	A Iniciar	Concluída Há: 171 dias
Treinamento dos Usuários e Integração com o Fluxo de Trabalho; Capacitação dos servidores; Ajustes finais na interface do usuário; Implementação da IA no ambiente de produção.	01/02/2026	30/04/2026	A Iniciar	Concluída Há: 9 dias
